

COMUNE DI AVETRANA

Provincia di Taranto

INTERVENTO MIRATO AL MIGLIORAMENTO GLOBALE DELL'EDIFICIO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO-IMPIANTISTICO E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTI DELL'EDIFICIO , ISTITUTO SCOLASTICO "GIOVANNI XXIII" - AVETRANA

PROGETTO ESECUTIVO

5					
4					
3					
2					
1					
0	Aprile 2015	L. Sportelli	L. Sportelli	L. Sportelli	Emissione progetto definitivo-esecutivo
Em./Rev.	Data	Red./Dis.	Verificato	Approvato	Descrizione

Titolo :

CRONOPROGRAMMA

TAVOLA

A.15

Scala

Progettazione:

Dott.Ing. Luca Sportelli



Committente:

Amministrazione Comunale

Il Sindaco


**INTERVENTO MIRATO AL MIGLIORAMENTO GLOBALE DELL'EDIFICIO DAL PUNTO DI VISTA
ENERGETICO-IMPIANTISTICO E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTI DELL'EDIFICIO ,
ISTITUTO SCOLASTICO "GIOVANNI XXIII" - AVETRANA**

CRONOPROGRAMMA

Pag. n.1

Cronoprogramma in forma tabellare

Giorni	20	20	20	20	20	25	25	30	30										
Importi parziali	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00										
Importi progressivi Euro	€ 55,00	€ 110,00	€ 165,00	€ 220,00	€ 275,00	€ 330,00	€ 390,00	€ 450,00	€ 510,00										

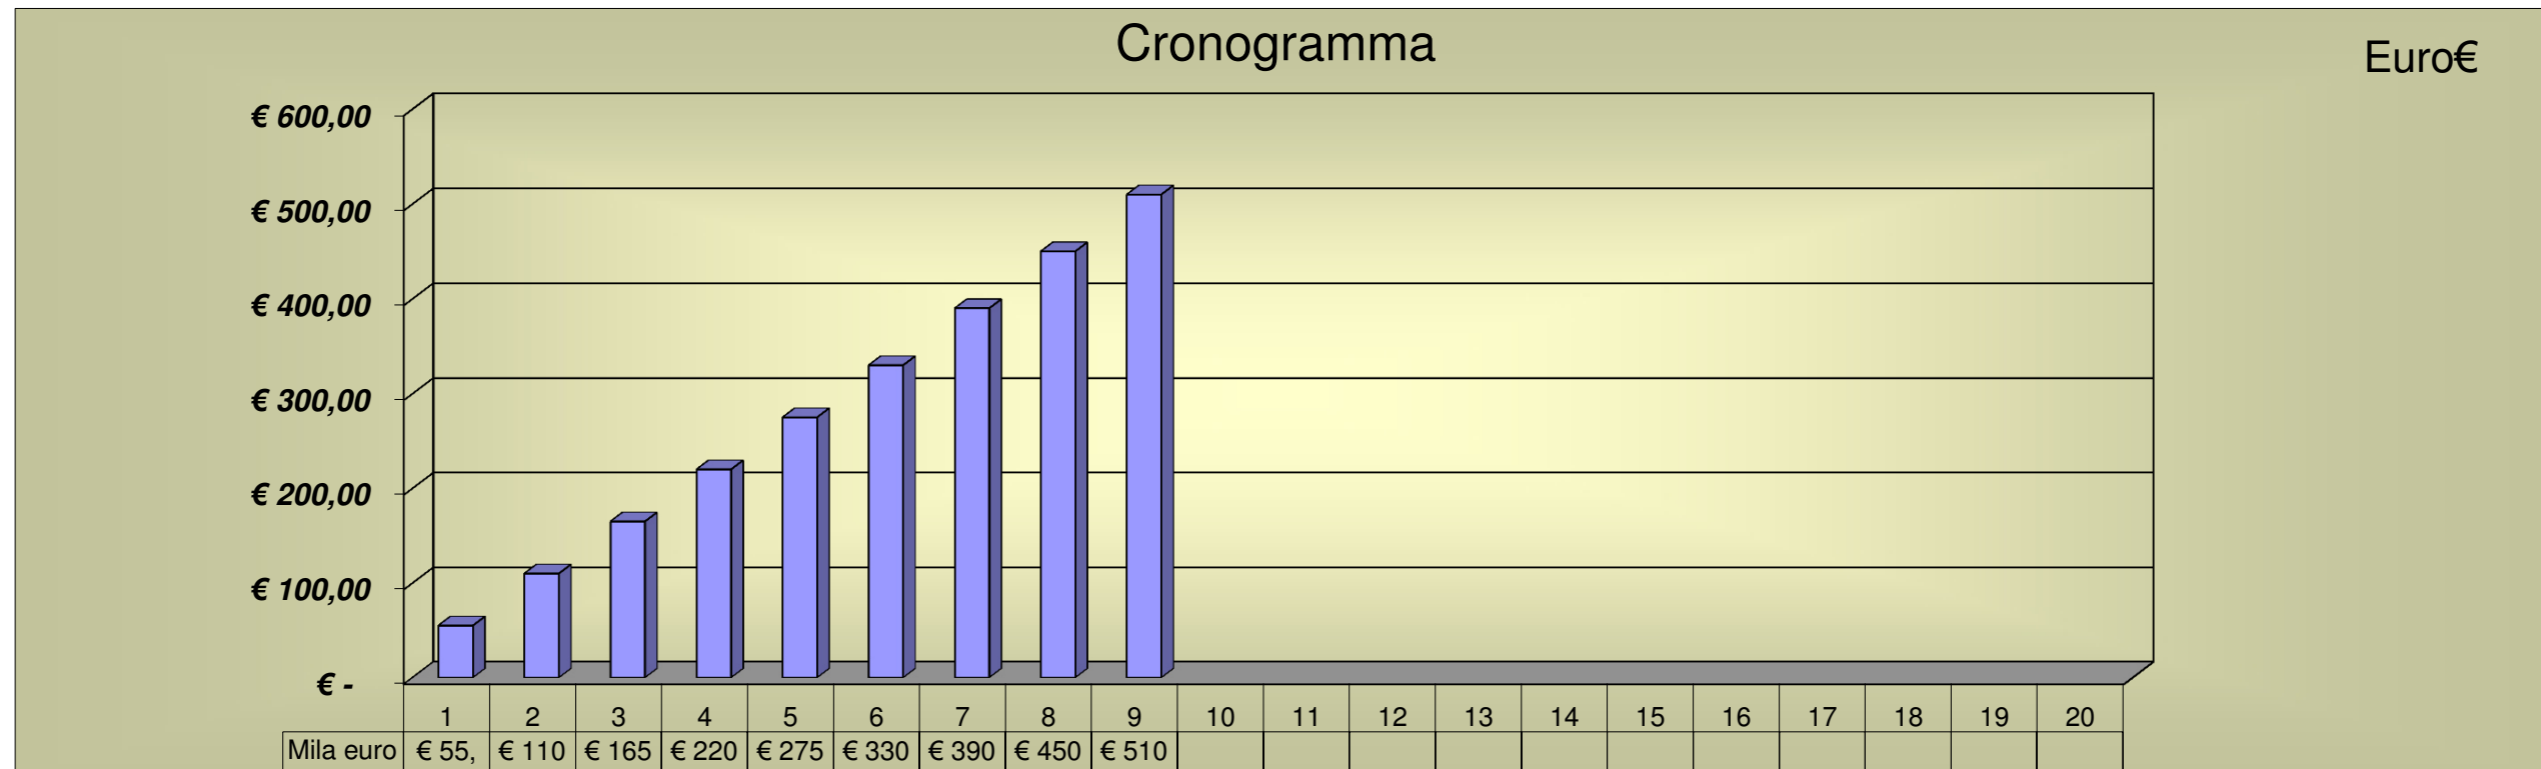


Con il cronoprogramma si determina l'importo al quale applicare l'eventuale maggiorazione per lavori che superano un anno.

importo contrattuale complessivo:	€	510 000,00
importo lavori afferenti al 1° anno	€	-
differenza (=importo da maggiorare, se così decretato dal Ministero dei LLPP)	_____ €	510 000,00

DURATA (gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	INSTALLAZIONE CANTIERE	03/09/2017	08/09/2017	5
2	B	MONTAGGIO IMPALCATURA	12/09/2017	27/09/2017	15
3	C.1	CAPPOTTO ESTERNO INTERNO	28/09/2017	27/11/2017	60
4	C.2	Realizzazione opere di eliminazione umidità	02/12/2017	22/12/2017	20
5	C.3	Montaggio soglie finestre:	01/12/2017	21/12/2017	20
6	C.4	Smontaggio e montaggio infissi:	07/01/2018	06/02/2018	30
7	C.5	IMPIANTI TERMICI	03/02/2018	28/02/2018	25
8	C.6	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	15/03/2018	30/03/2018	15
9	C.7	Realizzazione di opere murarie varie (muretto, cordoli,	28/03/2018	12/04/2018	15
10	C.8	Adeguamento impianto termo sanitario (solare termico)	15/03/2018	25/03/2018	10
11	C.9	Opere varie	12/04/2018	28/04/2018	16
12	D.1	SMOBILIZZO CANTIERE	29/04/2018	03/05/2018	4

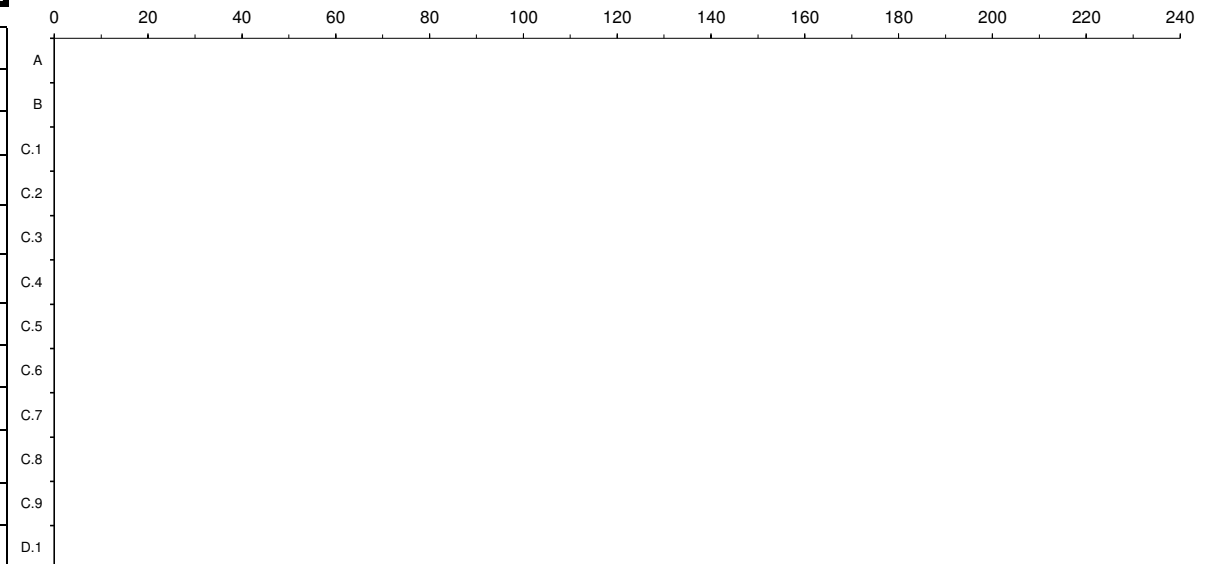

Inizio dei lavori

0 gg

Fine lavori

242 gg

TC

242 gg.
naturali consecutivi
